



Diretoria de Infraestrutura

PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA

Av. Ten. Raimundo Rocha, 1639 – Cidade Universitária – Juazeiro do Norte - CE



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI**

Dezembro/2022
Juazeiro do Norte



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
1.1 Objeto-Alvo do Plano.....	3
1.2 Descritivo dos Campi e Centro Multiuso	3
1.3 Legislação Consultada.....	4
1.4 Resultados Alcançados.....	4
2. LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI E CENTRO MULTIUSO– SITUAÇÃO	5
3. CRONOGRAMA DO PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA	9
3.1 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS BARBALHA	Erro! Indicador não definido.
3.2 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS BREJO SANTO	11
3.3 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS CRATO	12
3.4 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	18
3.5 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO VAPT-VUPT (CMS).....	28
3.6 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS ICÓ	Erro! Indicador não definido.
4. CONCLUSÕES FINAIS	30



1. APRESENTAÇÃO

O Plano de Acessibilidade da Universidade Federal do Cariri é o resultado de uma ação colaborativa entre os setores da Secretaria de Acessibilidade – Seace/UFCA e Diretoria de Infraestrutura – Dinfra/UFCA para promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência e garantir a sua participação plena e efetiva no convívio diário com a atividade pública da Universidade.

Para a promoção da acessibilidade, as ações foram divididas em etapas, onde os resultados alcançados da primeira etapa nos primeiros anos de execução deste Plano (2017/2018), representam o avanço do tema e contribuem para tornar realidade os direitos garantidos pelas normas e legislações, com destaque para a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) / Estatuto da Pessoa com Deficiência e NBR 9050/2015, norma de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

A consolidação dessas ações, no entanto ensejam continuidade, pois parcialmente foram finalizadas, uma vez que algumas dessas possuem prazo de execução em andamento e outras necessitam ainda ser implantadas, conforme as próximas etapas em razão da sua abrangência, essas serão melhor compreendidas pelo cronograma estabelecido no item 3.

O Plano de Acessibilidade foi elaborado conforme laudos de acessibilidade. Uma vez que as ações são monitoradas continuamente, o Plano de Acessibilidade é atualizado à medida que o status da execução dos serviços previstos muda.

1.1 Objeto-Alvo do Plano

Atender aos princípios constitucionais, normas e leis de acessibilidade física, a fim de criar condições/adaptações para que todos os usuários com capacidades diferentes de acordo com sua necessidade, utilizem todos os espaços de forma autônoma e em segurança, promovendo a universalização do acesso.

1.2 Descritivo dos Campi e Centro Multiuso

- Campus Barbalha – Engloba os blocos: Prédio Principal, Centro Acadêmico, Biotério, Restaurante Universitário e áreas de uso comum externas.



- Campus Brejo Santo – Engloba edificação e área de uso comum externa.
- Campus Crato – Engloba os blocos: Administração, Gabinete, Restaurante, Galpão, Salas de Aula, Laboratórios, Guarita, Multiuso, Quadra Poliesportiva, passarelas cobertas e áreas de uso comum externas.
- Campus Icó – Edificação térrea de apoio ao Centro de Educação a Distância.
- Campus Juazeiro do Norte – Engloba os blocos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Residência, 2 quadras, passarelas cobertas e áreas de uso comum externas.
- Vapt Vupt (CMS) – Engloba apenas a área usada pela UFCA (3º pavimento) e as áreas de uso comum, como elevador, escada e estacionamento.

1.3 Legislação Consultada

1. Norma Técnica NBR 9050/2015 da ABNT, sobre Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
2. Norma Técnica NBR 16537/2016 da ABNT, sobre Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
3. Norma Técnica NBR 9077/2001 da ABNT, sobre Saídas de emergência em edifícios;
4. Norma Técnica NBR 14718/2001 da ABNT, sobre Guarda-corpos para edificação;
5. Norma Técnica NBR 13434/2004 da ABNT, sobre Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;

1.4 Resultados Alcançados

Entre as ações de adaptações da primeira etapa que tiveram suas metas alcançadas, se realizou uma adequação da estrutura física existente, onde destacam-se: correção de inclinação das rampas, troca de esquadrias, execução de balizamento e guarda-corpo, instalação de corrimões, implantação de piso tátil, entre outros, conjuntamente relacionado as novas obras, como: urbanização, acesso público, novas edificações, entre outros, implantadas de acordo com as normas técnicas e adequação aos padrões de acessibilidade.

Espera-se, com o Plano de Acessibilidade um alinhamento entre os avanços normativos e legislativos, promovendo a eliminação de barreiras, sejam elas arquitetônicas, urbanísticas, comunicacionais, tecnológicas ou atitudinais. Os resultados obtidos serão importantes para



promover acessibilidade a todas as pessoas a utilizarem os espaços ou recursos da UFCA de forma autônoma, incentivado pelo compromisso ético, pela igualdade e inclusão social.

2. LOCALIZAÇÃO DOS CAMPI E CENTRO MULTIUSO- SITUAÇÃO

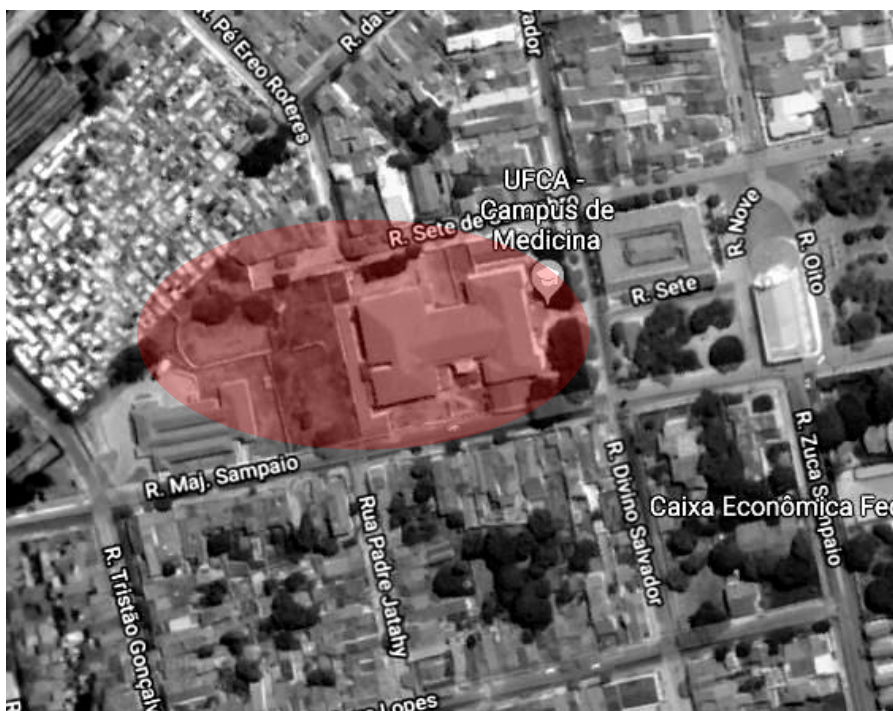


Fig. 01 - Localização Campus Barbalha, no bairro Alto do Rosário, com principal via de acesso: Rua Divino Salvador, Nº 284, Barbalha/CE.



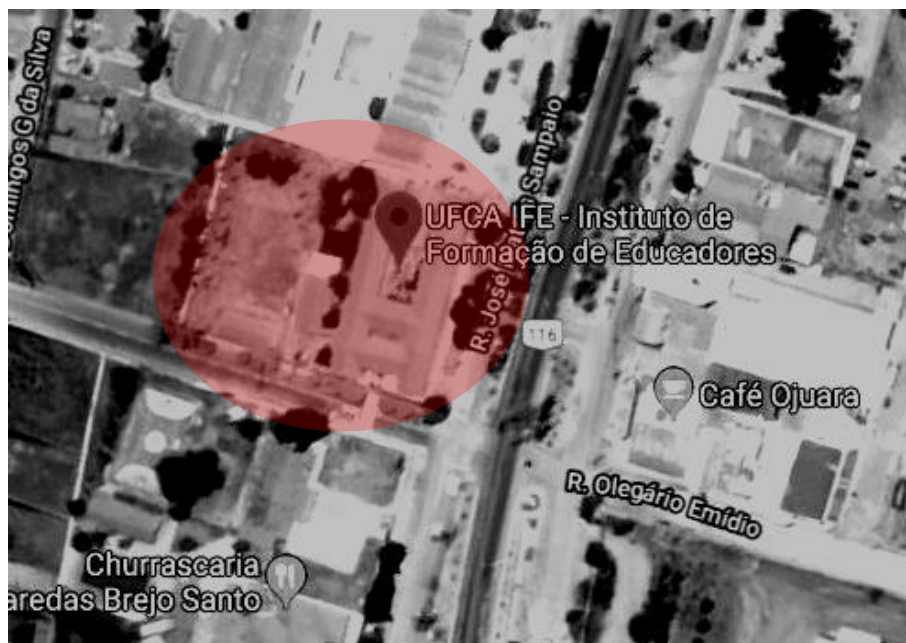


Fig. 02 - Localização Campus Brejo Santo, no bairro Centro, com principal via de acesso: Rua Olegário Emídio de Araújo, S/N, Brejo Santo/CE.

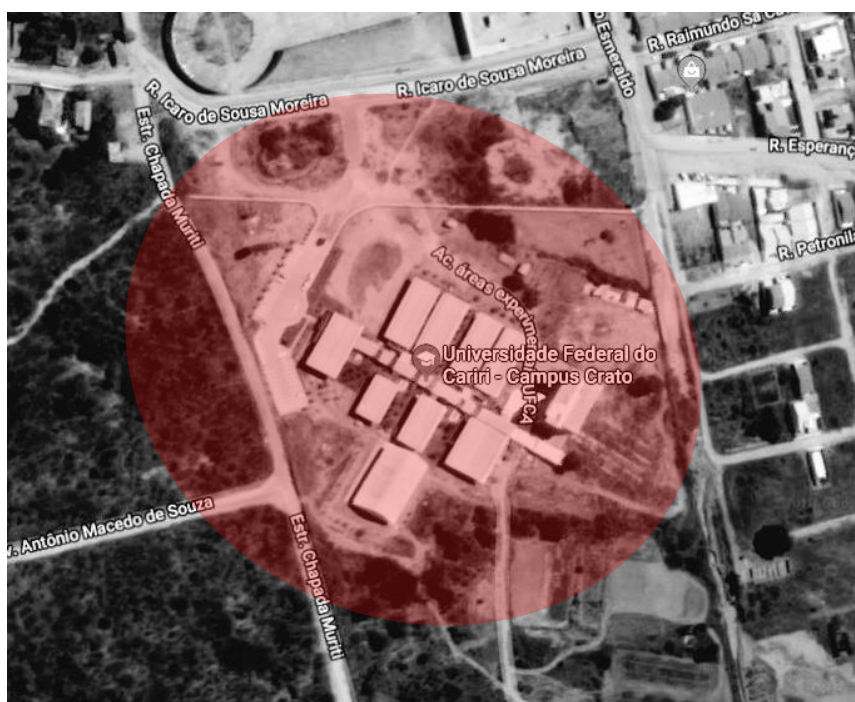


Fig. 03 - Localização Campus Crato, no bairro Barro Branco, com principal via de acesso: Rua Ícaro de Sousa Moreira, Nº 126 Crato/CE.





Fig. 04 - Localização Campus Icó, no bairro Centro, com principal via de acesso: Av. Josefa Monteiro, nº 1.668, Icó/CE.



Fig. 05 - Localização Campus Juazeiro do Norte, no bairro Cidade Universitária, com principal via de acesso: Avenida Tenente Raimundo Rocha, Nº 1639 Juazeiro do Norte/CE.



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI**

Plano de Acessibilidade Física

Av. Ten. Raimundo Rocha – Cidade Universitária –
Juazeiro do Norte - CE

Mês Ref.:
DEZ/2022

Pág.7

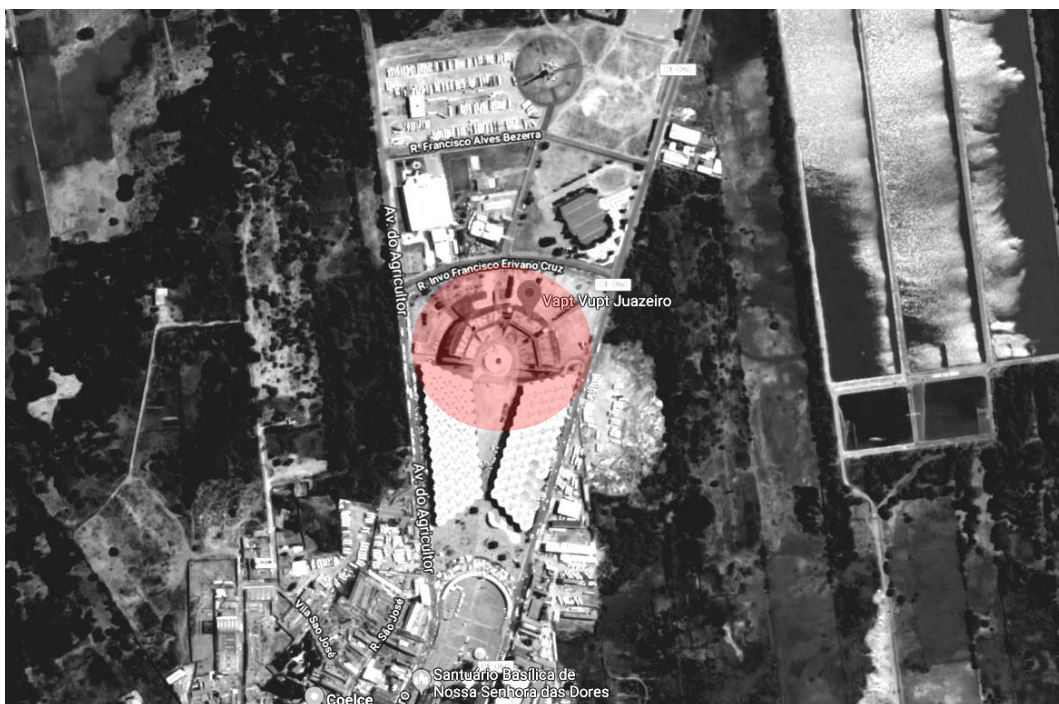


Fig. 06 - Localização Vapt Vupt (CMS), no bairro Centro, com principal via de acesso: Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, Nº 120, Juazeiro do Norte/CE.



3. CRONOGRAMA DO PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA

3.1 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS BARBALHA									
Local	Inconformidades / Pendências	Tempo de Projeto/Elaboração	Tempo de Execução	Meio de Aquisição Projeto/Obra	Responsável	Início (Obra)	Fim (Obra)	Status	
FAMED	Construção de Rampas de acesso principal	5 meses	1 ano	Adaptações	DINFRA	mai/18	set/18	Finalizado	
	Construção de Rampas de acesso entre pavimentos	5 meses	1 ano	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2022	Finalizado	
	Balizamento	1 semana	3 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado	
	Tela metálica nos Guarda-corpos	5 meses	1 ano	Adaptações	DINFRA	out/18	nov/18	Finalizado	
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2022	Finalizado
		Etapa 3	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2024	Readequação, em fase de planejamento
	Mapa Tátil	Etapa 1	2 semanas	1 mês	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2022	Finalizado



	Etapa 2	2 semanas	1 mês	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2024	Em fase de planejamento
Instalação de corrimão lateral rampa de acesso		2 semanas	2 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	dez/18	Finalizado
Instalação de corrimão lateral e intermediário escada de acesso		2 semanas	2 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	dez/18	Finalizado
Instalação de corrimão lateral escadas interna		2 semanas	2 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2022	Finalizado
Adaptação Banheiros Acessíveis - Independentes e divididos por sexo		3 semanas	2 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento
Instalação de Sinalização		2 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
Instalação de Plataforma		3 meses	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento



3.2 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS BREJO SANTO

Local	Inconformidades / Pendências	Tempo de Projeto/Elaboração	Tempo de Execução	Meio de Aquisição Projeto/Obra	Responsável	Início (Obra)	Fim (Obra)	Status
Edificação (EM REFORMA)	Piso Podotátil	1 mês	1 ano	Licitação de Obra	DINFRA	ago/17	jul/19	Finalizado
	Mapa Tátil	1 semana	1 semana	Licitação de Serviço	DINFRA	ago/17	jul/19	Finalizado
	Construção de Banheiros Acessíveis - Independentes e divididos por sexo	3 meses	1 ano	Licitação de Obra	DINFRA	ago/17	jul/19	Finalizado
	Instalação de Sinalização	3 meses	4 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Esquadrias	3 meses	6 meses	Licitação de Obra	DINFRA	ago/17	jul/19	Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento



3.3 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS CRATO

Local	Inconformidades / Pendências	Tempo de Projeto/Elaboração	Tempo de Execução	Meio de Aquisição Projeto/Obra	Responsável	Início (Obra)	Fim (Obra)	Status	
Bloco Administrativo	Balizamento	1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado	
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	dez/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra	
	Instalação de corrimão lateral nas rampas	2 semanas	1 mês	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra	
	Instalação de corrimão lateral e intermediário na escada de acesso	2 semanas	1 mês	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra	
	Adaptação Banheiros Acessíveis - Independentes e divididos por sexo	3 semanas	2 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento	
	Instalação de Sinalização	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento	



	Esquadrias	Etapa 1	1 semana	6 meses	Manutenção	DINFRA Manutenção	set/18	fev/19	Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
Bloco Gabinetes	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	dez/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Mapa Tátil		1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Adaptação Banheiros Acessíveis - Independentes e divididos por sexo		3 semanas	2 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento
	Instalação de Sinalização		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Esquadrias		1 semana	6 meses	Manutenção	DINFRA Manutenção	set/18	fev/19	Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
Bloco Laboratórios	Balizamento		1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	dez/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra



	Mapa Tátil		1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Adaptação Banheiros Acessíveis - Independentes e divididos por sexo		3 semanas	2 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento
	Instalação de Sinalização		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Esquadrias		1 semana	6 meses	Manutenção	DINFRA Manutenção	set/18	fev/19	Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
Bloco Refeitório	Balizamento		1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	dez/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Mapa Tátil		1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Instalação de Sinalização		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
		Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	dez/18	Finalizado



Bloco Salas de aula	Piso Podotátil	Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Mapa Tátil		1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Adaptação Banheiros Acessíveis - Independentes e divididos por sexo		3 semanas	2 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento
	Instalação de Sinalização		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Esquadrias		1 semana	6 meses	Manutenção	DINFRA Manutenção	set/18	fev/19	Finalizado
	Instalação de equipamento, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
Bloco Quadra Poliesportiva	Balizamento		1 semana	5 meses	Licitação de Obra	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2024	Em fase de obra
	Instalação de Sinalização		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento



Bloco Galpão	Balizamento		1 semana	5 meses	Adaptações		mai/18	nov/18	Finalizado
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	dez/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Mapa Tátil		1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Adaptação Banheiros Acessíveis - Independentes e divididos por sexo		3 semanas	2 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento
	Instalação de Sinalização		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Esquadrias		1 semana	6 meses	Manutenção	DINFRA Manutenção	set/18	fev/19	Finalizado
Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento	
Bloco Multifuncional	Balizamento		1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Mapa Tátil		1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra



	Instalação de Tela metálica na rampa de acesso ao Bloco	1 semana	3 semanas	Adaptações	DINFRA	mai/19	mai/19	Finalizado
	Instalação de corrimão lateral na rampa de acesso ao 1º andar	1 semana	1 mês	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Instalação de Sinalização	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Elevador	1 mês	3 meses	Processo de Aquisição - Processo Nº 122391.001353/2017-85	DINFRA Manutenção	2019	2019	Instalado/ Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
PASSARELA	Balizamento	1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
	Piso Podotátil	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	nov/18	Finalizado
	Instalação de corrimão lateral nas escadas	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra
	Instalação de corrimão lateral nas rampas	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2023	2025	Em fase de obra



	Instalação de Sinalização	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento

3.4 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE

Local	Inconformidades / Pendências	Tempo de Projeto/Elaboração	Tempo de Execução	Meio de Aquisição Projeto/Obra	Responsável	Início (Obra)	Fim (Obra)	Status	
Bloco A / Bloco C / Bloco E / Bloco G	Correção de Inclinação de Rampa	1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	set/18	Finalizado	
	Balizamento	1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado	
	Tela metálica nos Guarda-corpos	1 semana	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	fev/19	Finalizado	
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	dez/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Readequação/ Em fase de planejamento



	Mapa Tátil	1 semana		1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
	Instalação de corrimão lateral rampa de acesso do pavimento superior	Etapa 1	3 semanas	4 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Instalação de corrimão intermediário rampa de acesso do pavimento superior	Etapa 1	3 semanas	4 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Instalação de corrimão lateral escada interna	4 semanas		4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Regularização de Piso - Subsolo	3 semanas		1 mês	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
	Instalação de barras de apoio nas rampas e escadas no subsolo	3 semanas		1 mês	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
	Adaptação Banheiros Acessíveis - Independentes e divididos por sexo	1 mês		8 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento



	Instalação de Sinalização	3 meses	6 meses	Licitação	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento	
	Plataforma	6 meses	1 ano	Licitação de Serviço	DINFRA Manutenção	2024	2025	Em fase de planejamento	
	Esquadrias	1 semana	6 meses	Manutenção	DINFRA Manutenção	set/18	fev/19	Finalizado	
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento	
Bloco B / Bloco D / Bloco F / Bloco H / Bloco J	Correção de Inclinação de Rampa	1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	set/18	Finalizado	
	Balizamento	1 semana	5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado	
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	2024	2025	Readequação/ Em fase de planejamento
	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento	
	Instalação de corrimão lateral e intermediário na escada de acesso	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado	



	Instalação de corrimão lateral rampa de acesso	Etapa 1	3 semanas	4 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Instalação de Sinalização	3 meses		6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Esquadrias	1 semana		6 meses	Manutenção	DINFRA Manutenção	out/18	jan/19	Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses		6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
Bloco I	Correção de Inclinação de Rampa	1 semana		5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	set/18	Finalizado
	Balizamento	1 semana		5 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
	Instalação de Tela metálica nos Guarda-corpos	1 semana		3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	fev/19	Finalizado
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	nov/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Em fase de planejamento
	Mapa Tátil	1 semana		1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento



	Instalação de corrimão lateral rampa de acesso do pavimento superior	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado	
	Instalação de corrimão intermediário rampa de acesso do pavimento superior	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado	
	Instalação de corrimão lateral escada interna	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado	
	Instalação de Sinalização		3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Elevador	3 meses	3 meses	Licitação de Serviço	DINFRA Manutenção	out/18	abr/19	Instalado/ Finalizado	
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento	
Bloco K	Instalação de Tela metálica nos Guarda-corpos	1 semana	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	fev/19	Finalizado	
	Piso Podotátil	Etapa 1	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	out/18	nov/18	Finalizado
		Etapa 2	2 semanas	3 meses	Adaptações	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento



	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
	Instalação de corrimão lateral e intermediário rampa de acesso do pavimento superior	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Adequação de corrimão lateral escada interna	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Instalação de Sinalização	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Elevador	3 meses	3 meses	Licitação de Serviço	DINFRA Manutenção	abr/19	mai/19	Instalado/ Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
Bloco L	Inclinação de Rampa	1 mês	2 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2018	2019	Finalizado
	Balizamento	2 dias	2 dias	Licitação de Obra	DINFRA	fev/19	fev/19	Finalizado
	Instalação de Tela metálica nos Guarda-corpos	2 dias	1 semana	Licitação de Obra	DINFRA	fev/19	fev/19	Finalizado



	Piso Podotátil	1 mês	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
	Instalação de corrimão lateral rampa de acesso	1 mês	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Instalação de corrimão intermediário escada de acesso	1 mês	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Em fase de planejamento
	Instalação de Sinalização		6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em fase de planejamento
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento

Bloco M	Piso Podotátil	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento
	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento
	Instalação de corrimão lateral escada interna	3 semanas	1 ano	Licitação de Obra	DINFRA	fev/17	abr/19	Finalizado
	Instalação de Sinalização	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em Fase de Planejamento



	Elevador	3 meses	3 meses	Licitação de Serviço	DINFRA Manutenção	out/18	abr/19	Instalado
	Esquadrias	1 semana	6 meses	Licitação de Obra	DINFRA	nov/18	dez/18	Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento

Bloco N	Rampa	1 semana	5 meses	Licitação de Obra	DINFRA	fev/17	abr/19	Finalizado
	Instalação de Tela metálica nos Guarda-corpos	1 semana	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	fev/17	abr/19	Finalizado
	Instalação de corrimão lateral rampa de acesso	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	fev/17	abr/19	Finalizado
	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento
	Piso Podotátil	1 mês	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento
	Instalação de Sinalização	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em Fase de Planejamento
	Elevador	3 meses	3 meses	Licitação de Serviço	DINFRA Manutenção	out/18	abr/19	Instalado
	Esquadrias	1 semana	6 meses	Licitação de Obra	DINFRA	fev/17	abr/19	Finalizado



	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento
--	--	---------	---------	----------------------	--------	------	------	-------------------------

Quadras	Piso Podotátil	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	out/18	out/19	Finalizado
	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento
	Instalação de Sinalização	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2024	Em Fase de Planejamento
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento

Residência Acadêmica	Rampas	1 semana	5 meses	Licitação de Obra	DINFRA	mar/15	jul/17	Finalizado
	Piso Podotátil	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento
	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento
	Instalação de corrimão intermediário nas rampas internas	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado



	Instalação de corrimão lateral na escada interna	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Instalação de Sinalização	Em processo/andamento	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2025	Em Fase de Planejamento
	Elevador	2 semanas	3 meses	Licitação de Serviço	DINFRA Manutenção	mar/15	jul/17	Finalizado
	Esquadrias	1 semana	6 meses	Licitação de Obra	DINFRA	mar/15	jul/17	Finalizado
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	6 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em Fase de Planejamento

PASSARELA	Correção de Inclinação de Rampa	1 semana	5 meses	Licitação de Obra	DINFRA	mai/18	set/18	Finalizado
	Balizamento	1 semana	5 meses	Licitação de Obra	DINFRA	mai/18	nov/18	Finalizado
	Piso Podotátil	2 semanas	3 meses	Licitação de Obra	DINFRA	out/18	nov/18	Finalizado
	Mapa Tátil	1 semana	1 mês	Licitação de Serviço	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento
		Etapa 1	3 semanas	4 meses	Adaptações	DINFRA	mai/18	nov/18



	Instalação de corrimão lateral e intermediário nas escadas	Etapa 2	3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Instalação de corrimão lateral nas rampas		3 semanas	4 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2020	2021	Finalizado
	Instalação de Sinalização		Em processo/andamento	6 meses	Licitação de Serviço	DCOM	2024	2025	Em fase de planejamento
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.		3 meses	6 meses	Licitação de Obra	DINFRA	2024	2025	Em fase de planejamento

3.5 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO VAPT-VUPT (CMS)

Local	Inconformidades / Pendências	Tempo de Projeto/Elaboração	Tempo de Execução	Meio de Aquisição Projeto/Obra	Responsável	Início (Obra)	Fim (Obra)	Status
Edificação	Piso Podotátil	1 mês	1 ano	Licitação de Obra	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento
	Mapa Tátil	1 semana	1 semana	Licitação de Serviço	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento
	Instalação de Sinalização	3 meses	4 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento



	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	3 meses	Licitação de Serviço	DINFRA	2025	2026	Em fase de planejamento
--	--	---------	---------	----------------------	--------	------	------	-------------------------

3.6 PLANO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CAMPUS ICÓ

Local	Inconformidades / Pendências	Tempo de Projeto/Elaboração	Tempo de Execução	Meio de Aquisição Projeto/Obra	Responsável	Início (Obra)	Fim (Obra)	Status
Edificação	Piso Podotátil interno	1 mês	1 ano	Execução de serviço em parceria com a prefeitura	DINFRA e Prefeitura da cidade de Icó	2025	2026	Em fase de planejamento
	Mapa Tátil	1 semana	1 semana			2025	2026	Em fase de planejamento
	Instalação de Sinalização	3 meses	4 meses			2025	2026	Em fase de planejamento
	Instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios.	3 meses	3 meses			2025	2026	Em fase de planejamento



4. CONCLUSÕES FINAIS

Em atendimento à legislação e normas de acessibilidade vigentes no país, bem como ao artigo 120 da Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146 de 06 de julho de 2015, que exige a elaboração de relatórios circunstanciados das condições de acessibilidade para edifícios de cada esfera do governo, este plano apresenta um cronograma das questões técnicas de acessibilidade a serem desenvolvidas nos Campi da Universidade Federal do Cariri.

A partir da análise dos Laudos de Acessibilidade Física, foram identificados aspectos construtivos variados em desacordo com a legislação vigente e normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), expostos através do detalhamento de informações evidenciadas por meio de levantamento fotográfico.

Deve-se esclarecer que os Campi atendem ao ordenamento de alguns parâmetros, mas este não possui o entendimento do conceito semântico “parcialmente acessível”, devendo os Campi relatados cumprirem todos os quesitos requeridos em normas e leis específicas, necessitando de adaptações com o propósito de serem considerados acessíveis.

No que concerne à adaptação nos Campi, no Plano de Acessibilidade foram expressas as reais, plausíveis e prioritárias adaptações observando à obrigatoriedade e prazos estabelecidos por força das Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, regulamentadas pelo Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004.

Juazeiro do Norte, dezembro de 2022.



Igliane Teles do Bomfim

Arquiteta e Urbanista

Gerente da Divisão de Acessibilidade Física

Universidade Federal do Cariri

CAU A1036467 / SIAPE: 1049264



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI**

Plano de Acessibilidade Física

Av. Ten. Raimundo Rocha – Cidade Universitária –
Juazeiro do Norte - CE

Mês Ref.:
DEZ/2022

Pág.30
